

Građevina:

**DRŽAVNA CESTA D115 U BOLU
OD 10+750 DO 11+150
(od kružnog toka do mora)**

Investitor:



HRVATSKE CESTE d.o.o.
Vončinina 3, 10 000 Zagreb
OIB: 55545787885

Naručitelj:



OPĆINA BOL
Uz pjacu 2, 21 420 Bol
OIB: 88849172829

PROSTOR ZA OVJERU

Razina projekta:	ELABORAT
Vrsta projekta:	Elaborat privremene regulacije prometa
Oznaka projekta:	TKP 01/24-PR
Projekt:	DRŽAVNA CESTA D115 U BOLU OD 10+750 DO 11+150 (od kružnog toka do mora)
Lokacija zahvata:	<i>k.o. Bol, k.č. 6136/15</i>
Ovlašteni inženjer geodezije	Toni Božan, mag.ing.geod. Geo 1189
Projektant:	mr. Rade Gusić, dipl. ing. građ., G 1927
Suradnici:	Danijel Bakavić, ing. građ. Marija Šutalo Bakavić, ing. građ. Hana Župa, mag.ing.aedif.
Datum:	siječanj, 2024.
Direktor:	mr.sc. Rade Gusić, dipl.ing.građ

SADRŽAJ

1. OPĆI DIO

- 1.1. Izvod iz sudskog registra
- 1.2. Rješenje o imenovanju projekatana
- 1.3. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera

2. TEKSTUALNI DIO

- 2.1. Tehnički opis
- 2.2. Predmjer prometnih znakova i opreme

3. GRAFIČKI DIO PROMETNICE

- | | | | | |
|-----|---|----|----------|---------|
| 3.1 | Pregledna situacija | MJ | 1 : 5000 | 1 list |
| 3.2 | Situacije privremene regulacije prometa | MJ | 1 : 500 | 4 lista |

1. OPĆI DIO

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA



SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Temeljni akt:

- 2 Odlukom člana Društva od 09. studenog 2004. godine, izmijenjena je Izjava od 13. prosinca 1995. godine, u čl. 4 odredbe o tvrtci, u čl. 3 odredbe o djelatnosti, i u čl. 8 odredbe o temeljnom kapitalu. Pročišćeni tekst Izjave od 09. studenog 2004. godine, sa potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u zbirku isprava suda.
 - 3 Odlukom člana Društva od 30. siječnja 2012. godine, izmijenjena je Izjava od 9. studenog 2004. godine, u potpunosti. U bitnome, izmijenjene su odredbe o članovima Društva i o poslovnim udjelima.
- Potpuni tekst Izjave od 30. siječnja 2012. godine, s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u Zbirku isprava suda.

Promjene temeljnog kapitala:

- 2 Odlukom člana Društva od 09. studenog 2004. godine, temeljni kapitala sa iznosa od 19.900,00 kuna, povećan za iznos od 100,00 kuna, na iznos od 20.000,00 kuna.

OSTALI PODACI:

- 1 RUL I 27521

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Datum predaje	Godina	Obrračunsko razdoblje
eu 26.03.2012	2011	01.01.2011 - 31.12.2011

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/4582-6	11.09.1997	Trgovački sud u Splitu
0002 Tt-04/2405-5	07.12.2004	Trgovački sud u Splitu
0003 Tt-12/76-3	09.02.2012	Trgovački sud u Splitu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	25.03.2010	elektronički upis
eu /	30.03.2011	elektronički upis
eu /	26.03.2012	elektronički upis

U Splitu, 10. listopada 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

04.10.12

ovlaštena osoba
M. V. V. V. V. V.



ovlaštena osoba
M. V. V. V. V. V.

D004, 2012-10-10 11:58:09

Stranica: 2 od 2

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

060065255

OIB:

04257387859

TVRTKA:

- 2 PLATEA KONZALTING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor

- 2 PLATEA KONZALTING d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 1 Split, Grad Split
Stepinčeva 61

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 45 - Građevinarstvo
- 1 * - Tehničko ispitivanje i analiza
- 2 * - Projektiranje, nadzor, konzalting i inženjering
- 2 * - infrastrukturnih objekata
- 2 * - Izrada stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola za građevine niskogradnje
- 2 * - Izrada geodetskih elaborata i podloga
- 2 * - Stručni poslovi zaštite okolišta
- 2 * - Zastupanje inozemnih tvrtki
- 2 * - Kupnja i prodaja robe, trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 3 Rade Gusić, OIB: 59475570800
- 3 Split, Alojzija Stepinca 61
- 3 - član društva

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 2 Rade Gusić, OIB: 59475570800
- 2 Split, Alojzija Stepinca 61
- 2 - član uprave
- 2 - direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

- 2 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Temeljni akt:

D004, 2012-10-10 11:58:09

Stranica: 1 od 2

TKP 01/24-PR

Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 125/19) donosim slijedeće

RJEŠENJE

mr.sc. Rade Gusić, dipl.ing.građ. imenuje se za **PROJEKTANTA** projekta za zahvat :

DRŽAVNA CESTA D115 U BOLU OD 10+750 DO 11+150 (od kružnog toka do mora)

O b r a z l o ž e n j e

mr.sc. Rade Gusić, dipl.ing.građ. upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, čime je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlašteni inženjer građevinarstva".

Prema navedenom imenovani ispunjava uvjete iz članka 51. Zakona o gradnji (NN br.153/13 i 20/17, 125/19).

DIREKTOR

mr.sc. Rade Gusić, dipl.ing.građ.





REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-360-01/99-01/1927
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 15. studenog 1999.

Na temelju članaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva, rješavajući po zahtjevu koji je podnio GUSIĆ RADE mr., SPLIT, STEPINČEVA 61, za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva upisuje se **GUSIĆ RADE**, (JMBG 0103956380042), mr., SPLIT, pod rednim brojem 1927, s danom upisa **15.10.1999.** godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, GUSIĆ RADE, ing.grad. stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer građevinarstva**" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi sa člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlaštenom inženjeru izdaje se "**inženjerska iskaznica**" i stječe pravo na uporabu "**pečata**".

Obrazloženje

GUSIĆ RADE mr., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva.

Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa člankom 5. stavkom 4. i člankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva imenovani stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "inženjerske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.



Dostaviti:

1. GUSIĆ RADE
SPLIT, STEPINČEVA 61
uz povrat potvrde o izvršenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

**NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: DRŽAVNA CESTA D115 U BOLU OD 10+750 DO 11+150
(od kružnog toka do mora)****LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU: k.o. Bol, k.č. 6136/15,**

Ovaj elaborat je usklađen sa:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13,65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)

- Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23)
- Zakon o normizaciji (NN 80/13)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13; 153/13; 78/15; 12/18 i 118/18)
- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99; 151/03; 157/03; 87/09; 88/10; 61/11; 25/12; 136/12; 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10, 115/18)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom, (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)
- Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15, 68/18, 111/21)
- Zakon o regulaciji energetske djelatnosti (NN 120/12, 68/18)
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/18, 118/18, 127/19, 57/22)
- Zakon o rudarstvu (NN56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19)

Pravilnici

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19)
- Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste NN 140/13
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN95/14)
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94; 55/94; 142/03)
- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću (NN 78/13)
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara (NN 29/23, 87/15)
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (N.N. 56/12, 61/12)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom, (NN 117/17, 81/20)
- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)
- Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/09)
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN46/18)
- Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99)
- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (92/19)
- Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/11, 149/13, 82/14, 24/15, 42/16, 68/19)
- Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (NN 36/16)
- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN 75/13)
- Pravilnik o svjetlovodnim i distribucijskim mrežama (NN 57/2014)
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10 i 29/13)
- Pravilnik o radijskoj opremi (NN 25/2012, 49/16, 88/19)
- Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radio frekvencijskog spektra (NN 45/12, 50/12, 97/14, 116/17, 129/19, 139/21)
- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/2016, 88/19)
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
- Pravilnik o tehn. normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica (Službeni list 13/78)

Tehnički propisi i uredbе

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije, (NN 17/17)
 - Tehnički propis za asfaltne kolnike, (NN 48/2021)
 - Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17)
 - Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (NN 116/07, 56/11)
 - HRN EN ISO 9001:2002., Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi
 - Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, svezak I, II, III, IV i VI, prosinac 2001. god.
 - Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 33/10)
 - Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 117/2014, 52/19, 96/20)
 - Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme (NN 117/2014, 27/18, 52/19, 96/20)
 - Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 33/10)
 - HRN EN ISO 9001:2002., Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi
-
- HRN EN ISO 9001:2002., Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi

Projektant:

mr.sc. Rade Gusić, dipl. ing. građ., G1927

2. TEKSTUALNI DIO

2.1. TEHNIČKI OPIS

UVOD

Predmet ovog projekta je privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova izvanrednog održavanja dijela državne ceste D115 tj. ul. Bračka cesta u Bolu (od kružnog toka do mora).

Na predmetnoj predmetnoj dionici, a kroz zasebne projektne dokumentacije planirani su zahvati:

- *Izgradnja podzemnog armiranobetonskog kanala bujice Borak, u lijevom voznom traku kao zatvoreni betonskog kanala dimenzija svijetlog otvora 1700x1100 mm prema glavnom projektu „Geoprojekt“ ; siječanj 2019; TD 1223-P3-15-04-1.*
- *Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Bol, II. faza izgradnje, Tlačni cjevovodi iz crpne stanice "Centar" do UPOV-a "Podborje", Kopnena dionica“, u desnom kolniku koji je izradio HIDROPROJEKT-ING d.o.o. Zagreb, u siječnju 2014., oznaka projekta: 1912/2010.*
- *DRŽAVNA CESTA D115 U BOLU OD 10+750 DO 11+150 (od kružnog toka do mora), TKP 01/24, sijačanj 2024, koji je izradila Platea konzalting d.o.o.*

Predmetna državna cesta je gotovo jedini cestovni pravac na području općine Bola koja se proteže od mjesta prema ostalim naseljima otoka Brača.

Položaj predmetnog zahvata je vidljiv na preglednoj situaciji mjerila 1:5.000 koja je sastavni dio ovog projekta.

Privremena regulacija prometa je predviđena obzirom na opće karakteristike ceste (tlocrtni elementi, preglednost, obim prometa, operativne brzine na dionici ceste i sl.) i obzirom na položaj radova. Privremenu regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova izvesti u četiri faze:

- **Faza 1** počinje od početka zahvata prema projektu izvanrednog održavanja dijela državne ceste D115, u dužini od 30m. Radovi se izvode u zapadnom kolničkom traku i pripadajućem nogostupu, a tijekom izvođenja radova predviđena je privremena regulacija prometa svjetlosnim uređajima (semafori) na način da će se vozila propuštati naizmjenično istočnim voznim trakom.
- **Faza 2** obuhvaća područje od 145m od završetka faze 1. Radovi se izvode u zapadnom kolničkom traku i pripadajućem nogostupu, a tijekom izvođenja radova predviđena je privremena regulacija prometa svjetlosnim uređajima (semafori) na način da će se vozila propuštati naizmjenično istočnim voznim trakom.
- **Faza 3** obuhvaća područje od 130m od završetka faze 2. Radovi se izvode u zapadnom kolničkom traku i pripadajućem nogostupu, a tijekom izvođenja radova predviđena je privremena regulacija prometa svjetlosnim uređajima (semafori) na način da će se vozila propuštati naizmjenično istočnim voznim trakom.
- **Faza 4** obuhvaća područje od 180m od završetka faze 3 tj do kraja zahvata. Radovi se izvode u zapadnom kolničkom traku i pripadajućem nogostupu, a tijekom izvođenja radova predviđena je privremena regulacija prometa svjetlosnim uređajima (semafori) na način da će se vozila propuštati naizmjenično istočnim voznim trakom.

Sve je prikazano u grafičkim prilogima 3.2.

Tijekom izvođenja radova je potrebno osigurati nesmetan i siguran prolazak pješaka, te prije početka radova obavijestiti susjedne stanare o izmjenama u regulaciji prometa. Ukoliko je moguće i sigurno, prometne znakove i opremu postaviti da ne smetaju prilazima i ulazima susjednim stambenim jedinicama. Izvođač radova obavezan je u lokalnim javnim medijima objaviti datum početka radova, trajanje radova i uputu o privremenoj regulaciji prometa. Izvođač radova dužan je obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, te biti sa njima u stalnom kontaktu. O tijeku izvođenja radova izvođač radova je također dužan redovito izvješćivati i interventne službe (Službu hitne pomoći, vatrogasce), a također treba biti u stalnom kontaktu sa djelatnicima prometne policije.

Prometna signalizacija i oprema ceste

Prometnu regulaciju potrebno je u svemu izvesti u skladu s "Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama" (NN 92/19) i „Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguravanju radova na cestama“ (NN 92/19). Raspored znakova prometne regulacije je dan u situacijskom prikazu regulacije (grafički prilog 3.3.), a broj potrebnih znakova je iskazan u specifikaciji prometne signalizacije (tekstualni dio 2.2.). Primijenjeni znakovi su sljedećih dimenzija:

- znakovi oblika trokuta dimenzija 90 cm
- okrugli znakovi promjera 60 cm
- znakovi oblika kvadrata dimenzija 90X90 cm
- dopunske ploče dimenzija 60X30 cm
- Putokazi dimenzija 30x120cm

Prometni znakovi postavljaju se na prenosiva postolja. Stupovi nosači prometnih znakova su čelični promjera \varnothing 63,5 mm, zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja. Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se označuju privremeni radovi (privremena regulacija) moraju biti obojani izmjeničnim poljima crvene i bijele boje tako da su polja široka po 25 cm. Ukoliko postoji mogućnost, znakovi se mogu postaviti i na postojeće stupove. Ukoliko se ipak neki znak postavlja poput trajnog znaka, postavlja se na čelične stupove promjera 63.5 mm. Temelj stupova izvesti od betona C 20/25 u obliku krnje piramide s gornjom stranicom kvadrata od 30 cm, donjom od 40 cm i visinom 70 cm. Znakove zakrenuti za 3-5 stupnjeva u odnosu na os prometnice zbog smanjenja refleksije i to tako da najistaknutija točka znaka bude udaljena 50 cm, a ako to nije moguće minimalno 30 cm od ruba kolnika. Znakovi se postavljaju na visini od 0.30 do 2.20 m.

Postojeće prometne znakove koji su u koliziji s privremenom regulacijom potrebno je ukloniti/prekriti trakom C104 za vrijeme radova. Radno polje potrebno je ograditi propisnom zaštitnom ogradom. U slučaju izvođenja radova noću, radni stroj mora imati ugrađeno rotirajuće svjetlo, a gradilište obilježeno svjetlosnim znakovima (treptači). Sve radove je potrebno izvršiti u što kraćem periodu kako bi se što prije osigurao postojeći režim odvijanja prometa. Po završetku radova potrebno je ukloniti privremenu prometnu signalizaciju i prometnicu dovesti u prvobitno stanje.

U skladu s pojedinom fazom privremene prometne signalizacije, odnosno dijela postojeće prometnice na kojem se odvijaju radovi potrebno je osigurati da se predmetni dio gradilišta ogradi od mogućeg pješackog prometa, a radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište. Ograđivanje gradilišta nije dopušteno na način koji bi mogao ugroziti prolaznike. Vanjska granica gradilišta mora biti označena i izvedena tako da je lako uočljiva i prepoznatljiva prema okolini.

Ograđivanje granice gradilišta prema pješackom prometu izvesti mobilnom gradilišnom ogradom ili armaturnim mrežama učvršćenim na stupove. Ograda je samostojeća sa vratima za ulaz i izlaz na gradilište. Na ogradu se ne smije naslanjati nikakav materijal. Ako tijekom radova dođe do oštećenja ograde, ista se mora odmah popraviti kako bi se izbjegao pristup na gradilište nezaposlenim osobama. Elementi ograde postavljaju se na betonske ili gumene podloške. Uz gradilišnu ogradu postavljaju se ploče za obilježavanje radova na cesti ili oštećenja kolnika K09 i K09-1 sa trepćućim žutim svjetlom G17.



Da bi se moglo pristupiti regulaciji prometa u skladu s ovim projektom, neophodno je u potpunosti dovršiti postavljanje svih njome predviđenih znakova za privremeno reguliranje prometa. Izvođač radova je također dužan nakon završetka radova ukloniti svu privremenu prometnu signalizaciju postavljenu prema ovom projektu i prometnicu dovesti u stanje kao prije početka radova. Sve radove koji se nisu mogli predvidjeti ovim projektom, a tijekom izvođenja radova se pokažu nužnim, moguće je izvesti samo uz prethodno odobrenje nadzornog inženjera gradilišta.

Napomena: *privremenom regulacijom prometa obrađeno je prometno rješenje, dok mjere zaštite na radu nisu predmet obrade ovog projekta.*

Projektant:

mr.sc. Rade Gusić, dipl. ing. građ., G1927

2.2. PREDMJER PROMETNIH ZNAKOVA I OPREME

Faza 1

 A08-1	3 komada	90X90X90 cm
 A08-2	1 komad	90X90X90 cm
 A14	3 komada	90X90X90 cm
 A15	8 komada	90X90X90 cm
 A18	2 komada	90X90X90 cm
 B30	2 komada	∅ 60 cm
 B05	1 komad	∅ 60 cm
 B47-1	1 komad	∅ 60 cm
 B47	1 komad	∅ 60 cm
 B45-2	1 komad	∅ 60 cm
 B45	-	∅ 60 cm
 C01	1 komad	60X60 cm
 C101	1 komad	30X120
 C104	2 komada	
 E01	1 komad	60X30 cm
 E03	1 komad	60X30 cm
 E03	1 komad	60X30 cm
 K09	1 komad	200X25 cm
 K09-1	1 komad	200X25 cm
 K15-1	10 komada	25X100 cm
 G17	8 komada	∅ 18 cm
SEMAFOR	2 komada	





















Faza 2

 A08-1	3 komada	90X90X90 cm
 A08-2	1 komad	90X90X90 cm
 A14	2 komada	90X90X90 cm
 A15	8 komada	90X90X90 cm
 A18	2 komada	90X90X90 cm
 B30	2 komada	Ø 60 cm
 B05	1 komad	Ø 60 cm
 B47-1	1 komad	Ø 60 cm
 B47	1 komad	Ø 60 cm
 B45-2	-	Ø 60 cm
 B45	1 komad	Ø 60 cm
 C01	1 komad	60X60 cm
 C101	2 komada	30X120
 C104	2 komada	
 E03	1 komad	60X30 cm
 E03	1 komad	60X30 cm
 E03	1 komad	60X30 cm
 K09	1 komad	200X25 cm
 K09-1	1 komad	200X25 cm
 K15-1	44 komada	25X100 cm
 G17	8 komada	Ø 18 cm
 SEMAFOR	2 komada	

Faza 3

 A08-1	1 komad	90X90X90 cm
 A08-2	1 komad	90X90X90 cm
 A14	2 komada	90X90X90 cm
 A15	4 komada	90X90X90 cm
 A18	2 komada	90X90X90 cm
 B30	2 komada	Ø 60 cm
 B05	1 komad	Ø 60 cm
 B47-1	1 komad	Ø 60 cm
 B47	1 komad	Ø 60 cm
 B45-2	-	Ø 60 cm
 B45	-	Ø 60 cm
 C01	1 komad	60X60 cm
 C101	2 komada	30X120
 C104	2 komada	
 E01	-	60X30 cm
 E03	-	60X30 cm
 E03	-	60X30 cm
 K09	1 komad	200X25 cm
 K09-1	1 komad	200X25 cm
 K15-1	40 komada	25X100 cm
 G17	4 komada	Ø 18 cm
 SEMAFOR	2 komada	

Faza 4

 A08-1	1 komad	90X90X90 cm
 A08-2	1 komad	90X90X90 cm
 A14	2 komada	90X90X90 cm
 A15	4 komada	90X90X90 cm
 A18	2 komada	90X90X90 cm
 B30	2 komada	∅ 60 cm
 B05	1 komad	∅ 60 cm
 B47-1	1 komad	∅ 60 cm
 B47	1 komad	∅ 60 cm
 B45-2	-	∅ 60 cm
 B45	-	∅ 60 cm
 C01	1 komad	60X60 cm
 C101	3 komada	30X120
 C104	8 komada	
 E01	-	60X30 cm
 E03	-	60X30 cm
 E03	-	60X30 cm
 K09	1 komad	200X25 cm
 K09-1	1 komad	200X25 cm
 K15-1	50 komada	25X100 cm
 G17	4 komada	∅ 18 cm
 SEMAFOR	2 komada	

3. GRAFIČKI DIO PROMETNICE

3.1	Pregledna situacija	MJ	1 : 5000	1 list
3.2	Situacije privremene regulacije prometa	MJ	1 : 500	4 lista



građevina

DRŽAVNA CESTA D115 U BOLU
 OD 10+750 DO 11+150
 (od kružnog toka do mora)

projektant

mr. sc. RADE GUSIĆ, d.i.g.

suradnici

Danijel Bakavić, i.g.

Marija Sutalo Bakavić, i.g.



investitor

HRVATSKE CESTE d.o.o.
 Vončinina 3, ZAGREB

sadržaj

PREGLEDNA SITUACIJA

oznaka	TKP 01/24-PR	prilog
datum	siječanj, 2024.	3.1.
mjerilo	1 : 5000	

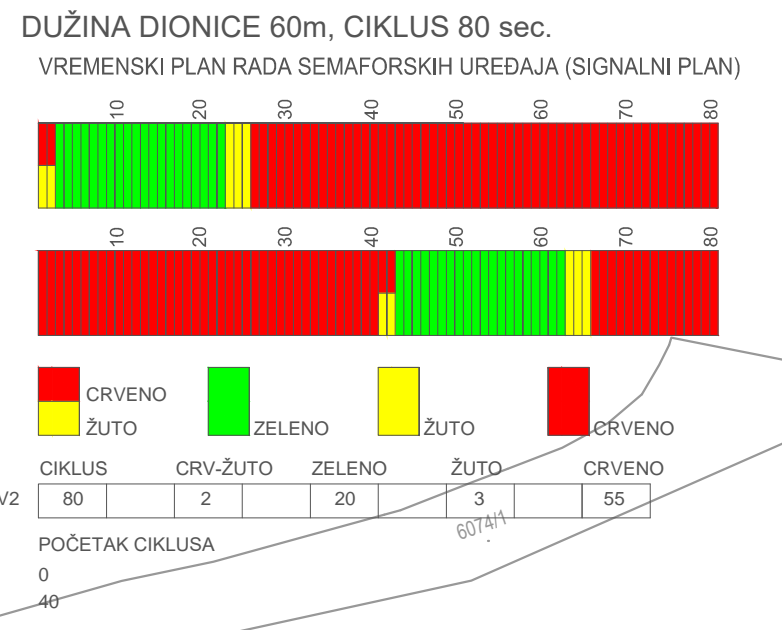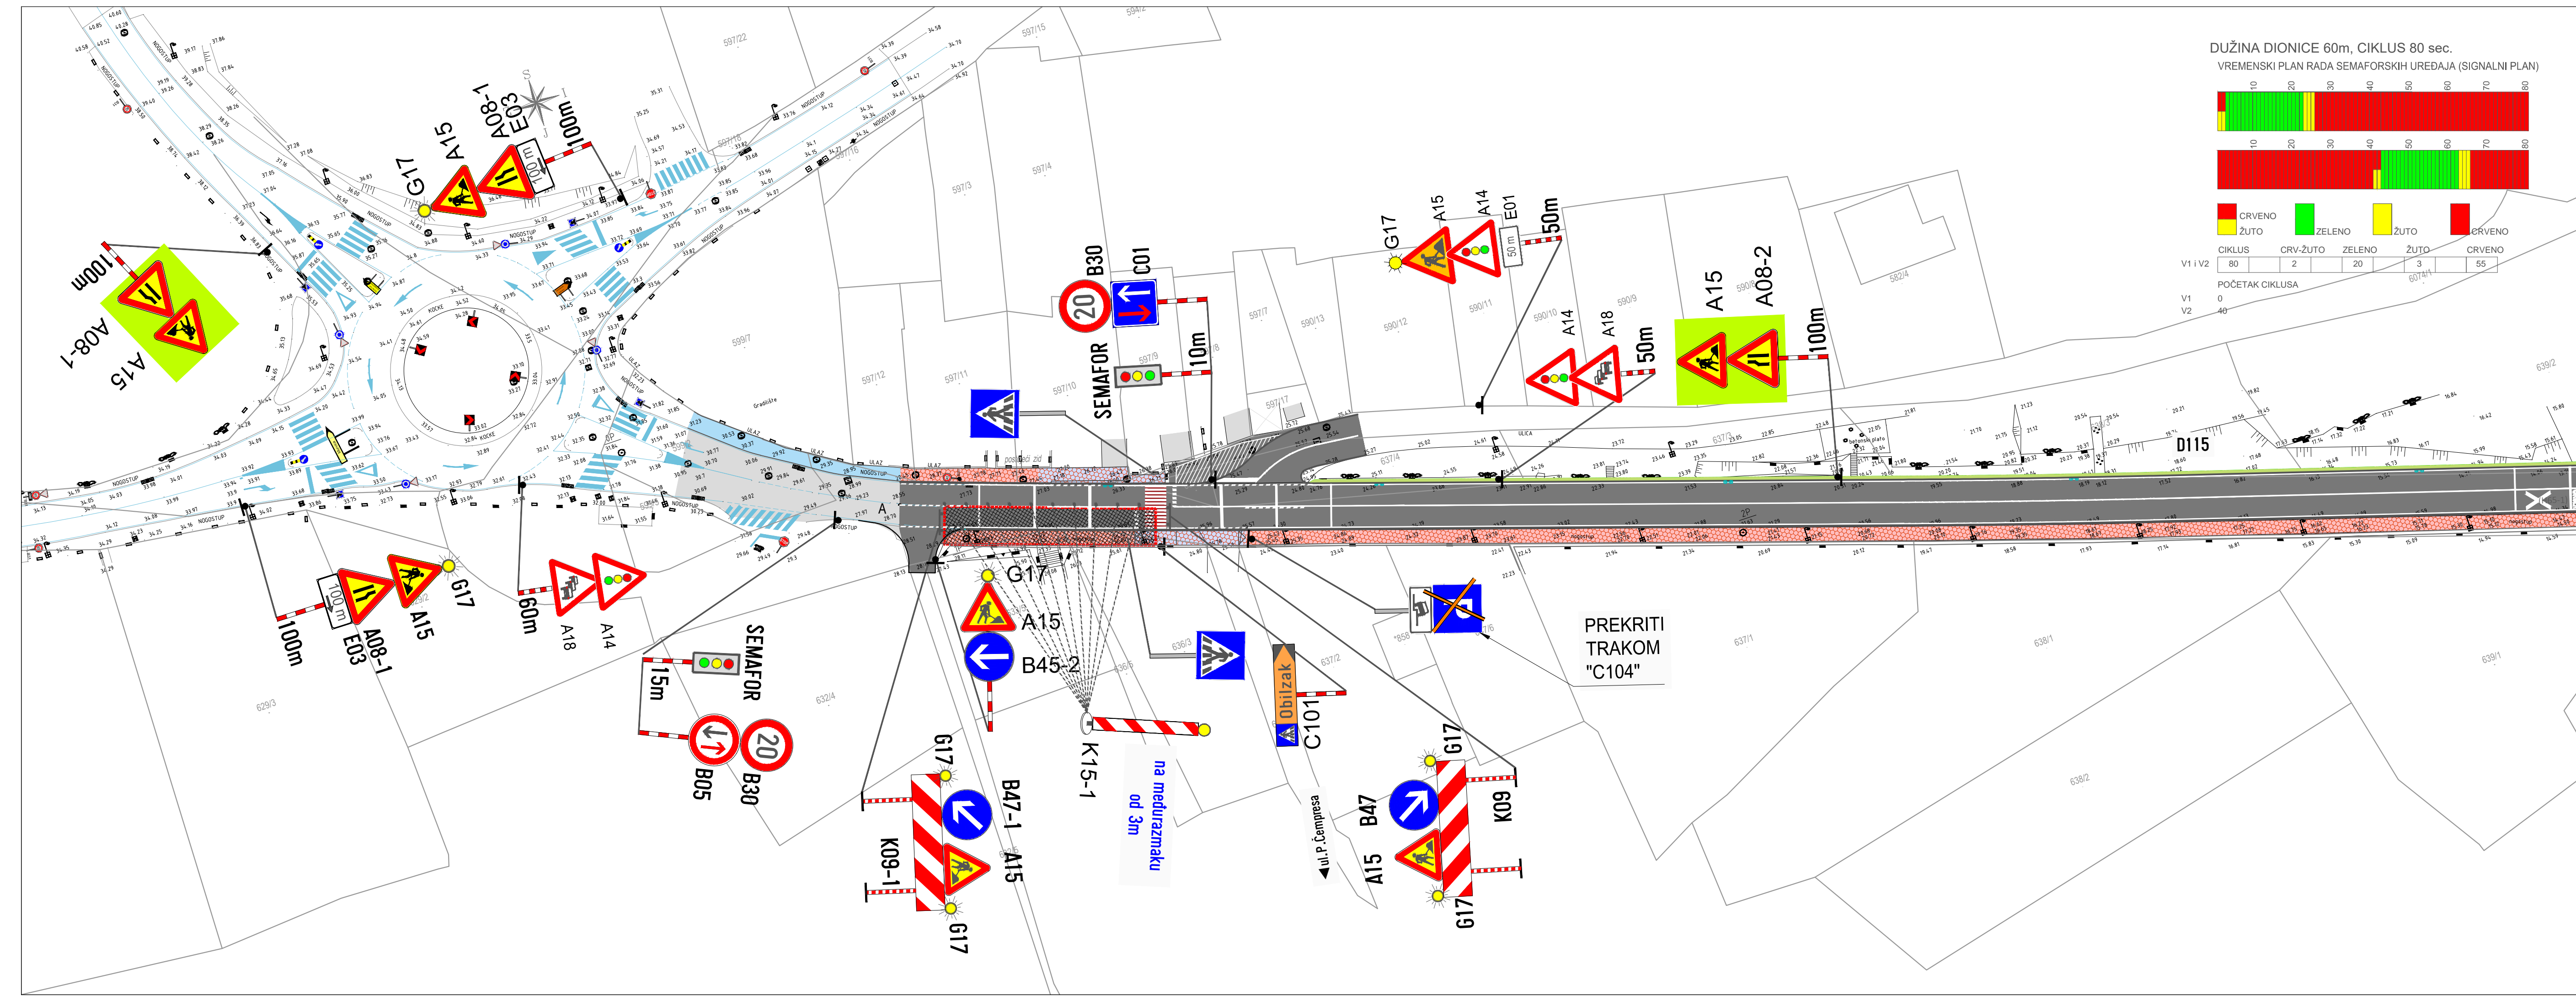

platea
KONZALTING

građevina

DRŽAVNA CESTA D115 U BOLU
OD 10+750 DO 11+150
(od kružnog toka do mora)

projektant

m.sc. RADE GUSIĆ, d.i.g.

suradnici

Danijel Bakavić, i.g.
 Marija Šutalo Bakavić, i.g.



investitor


HRVATSKE CESTE d.o.o.
 Vončinina 3, ZAGREB









sadržaj

PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA
FAZA 1

oznaka	TKP 01/24-PR	prilog	
mjenilo	siječanj, 2024.		3.2.-list 1
	1 : 500		

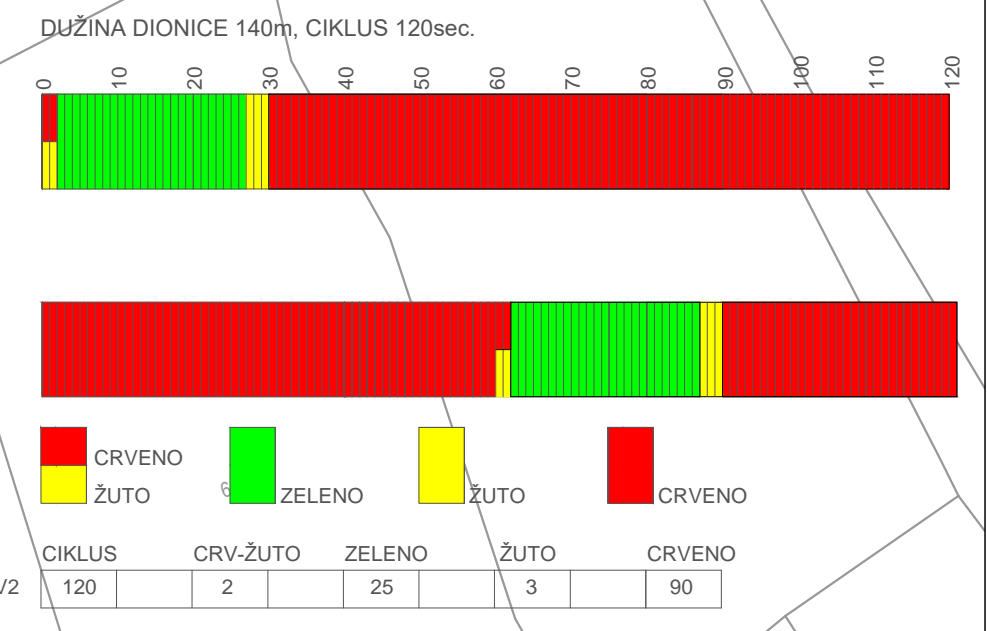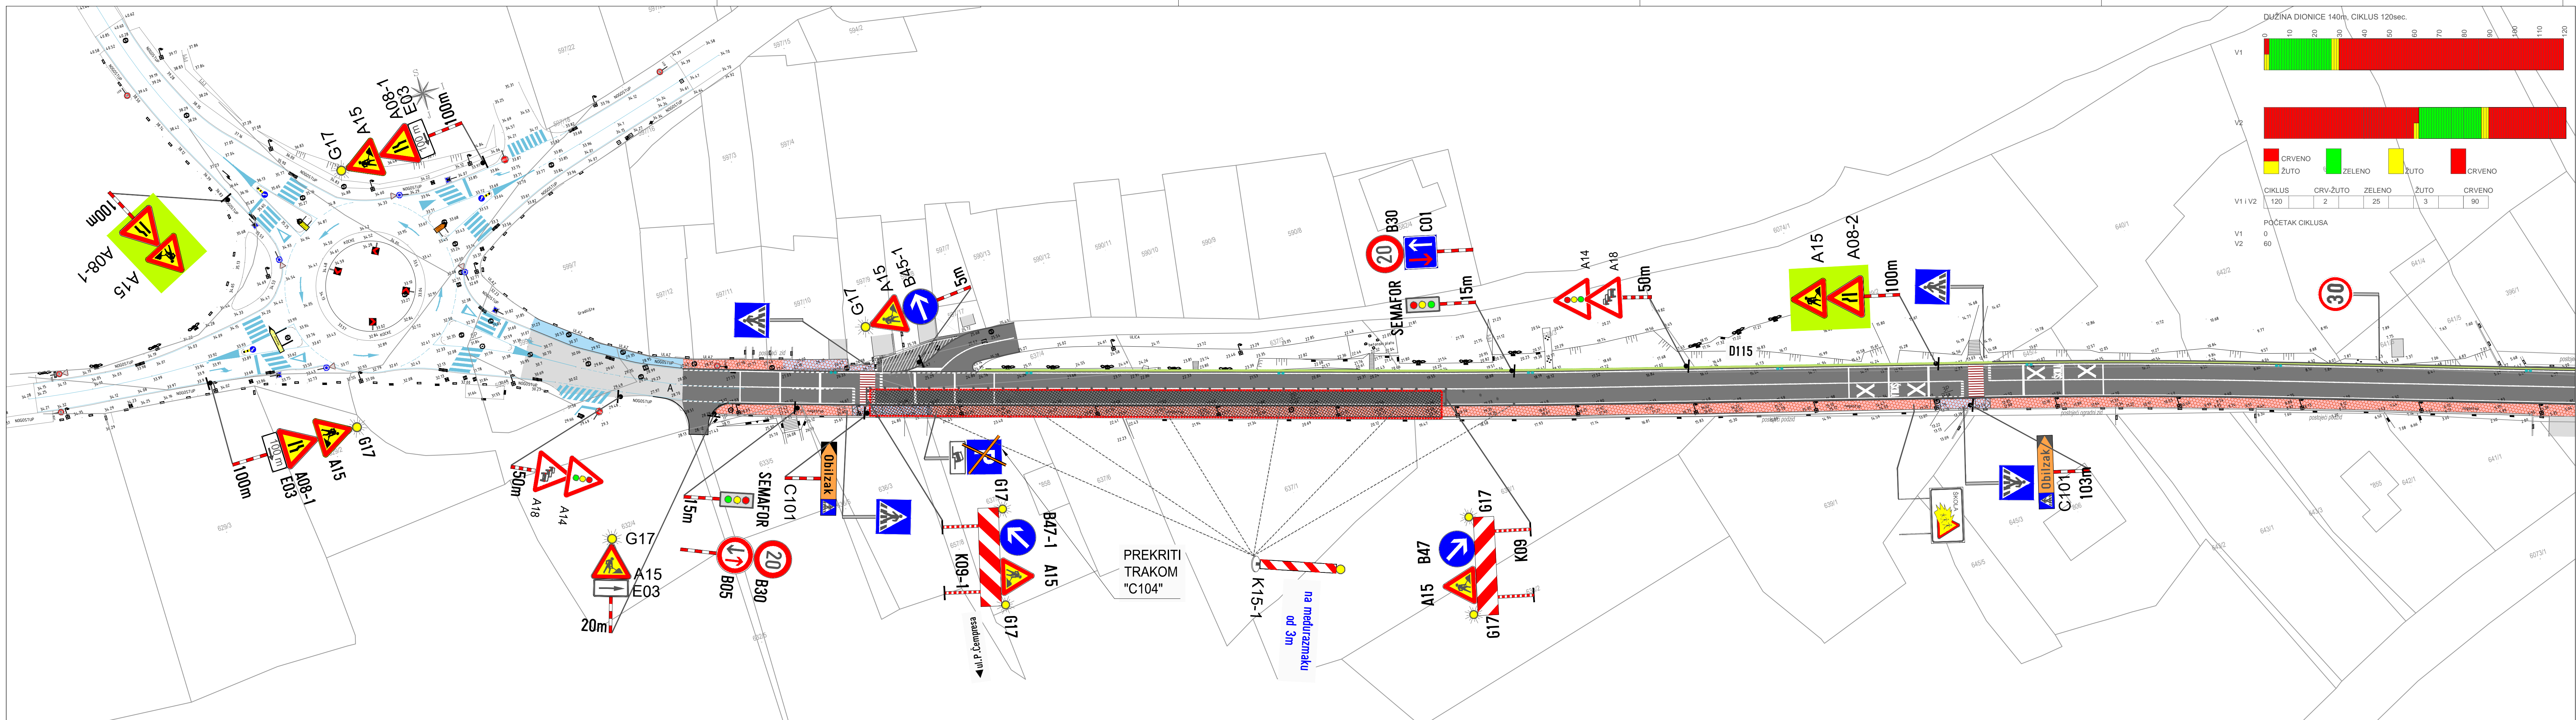

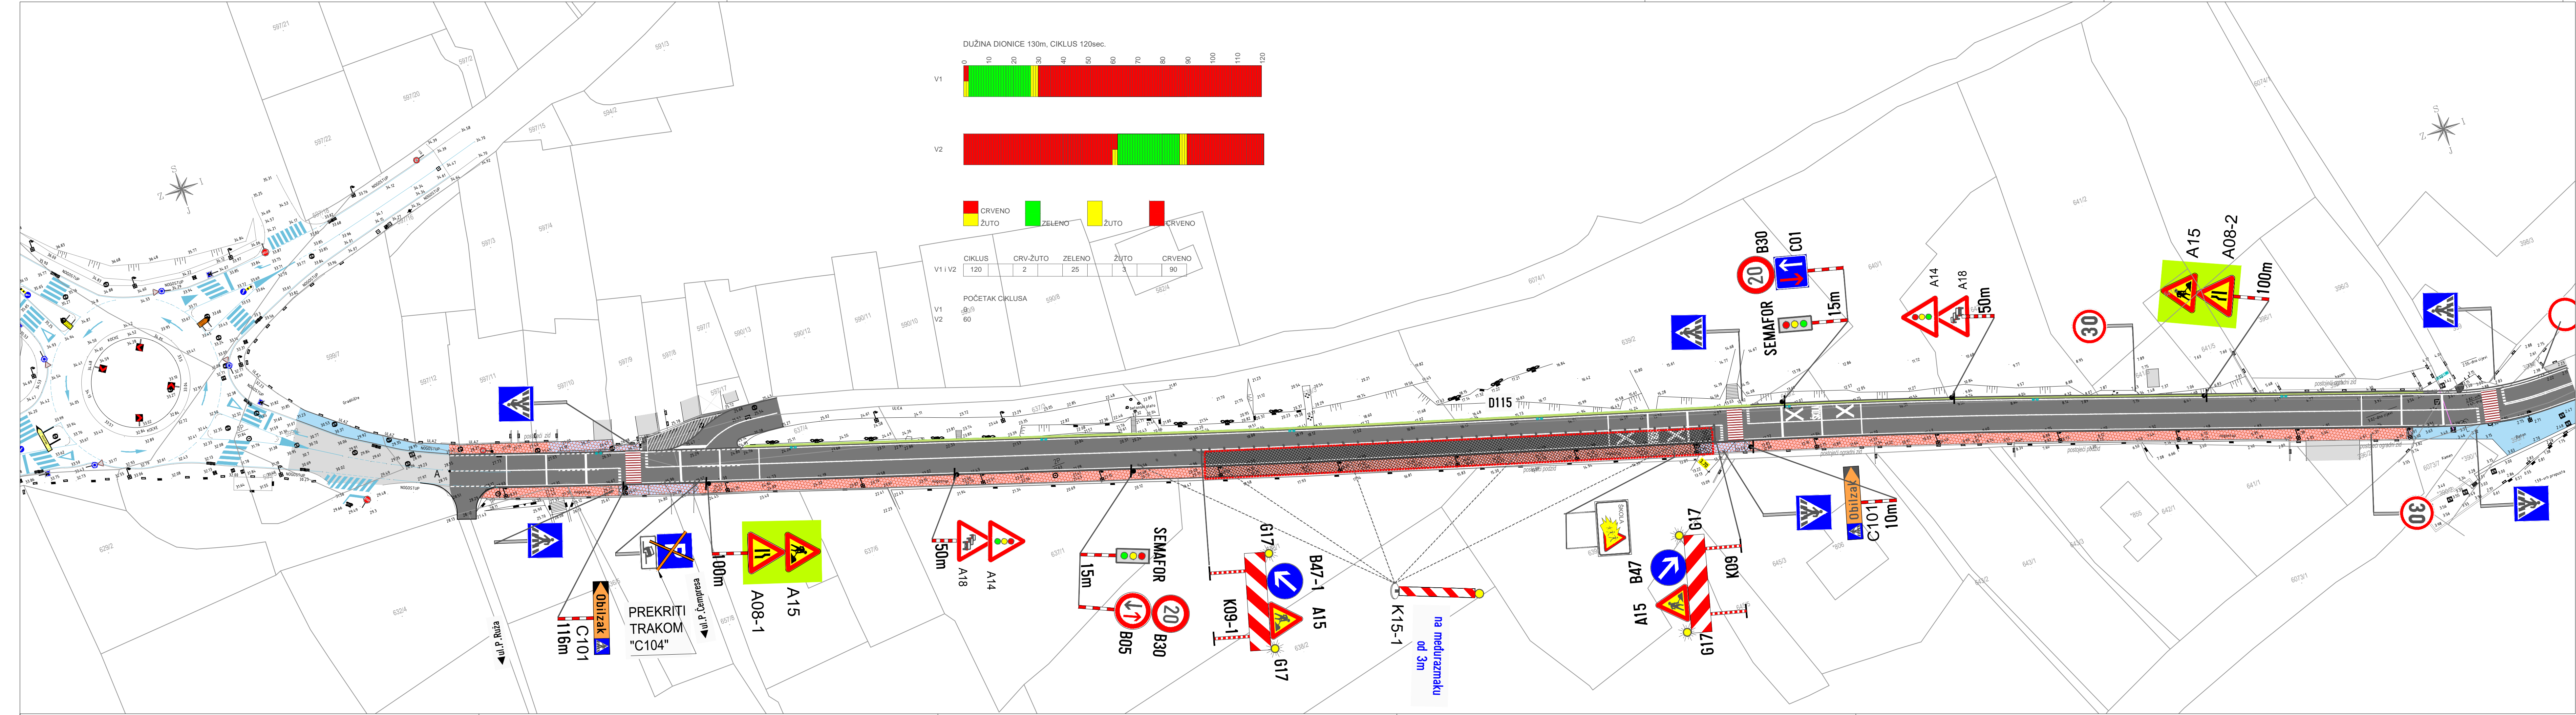

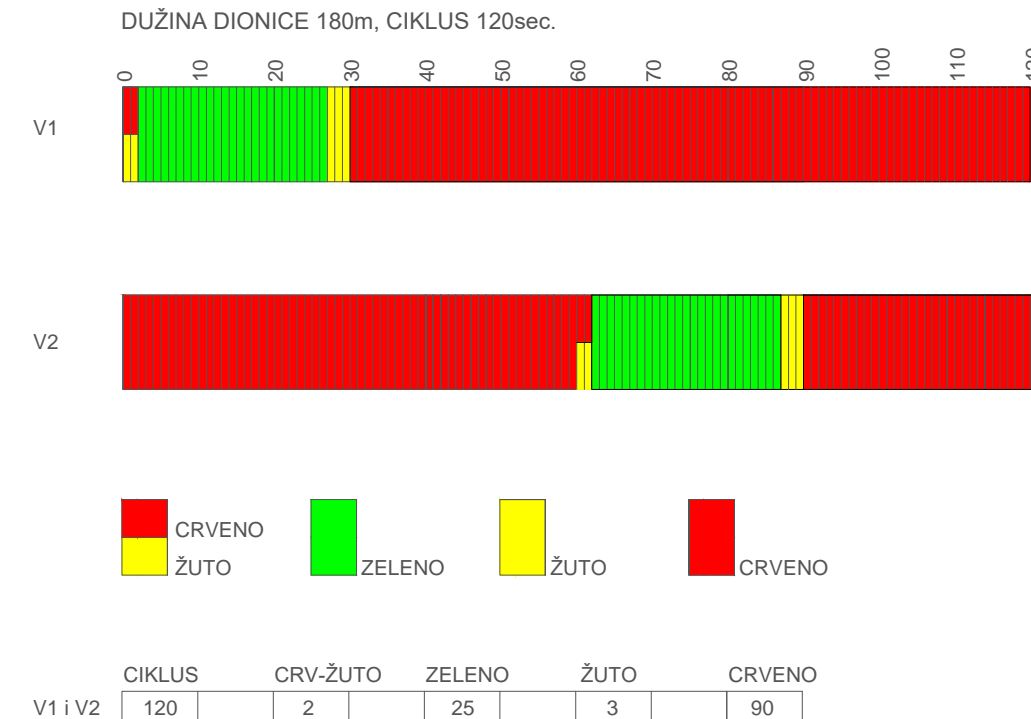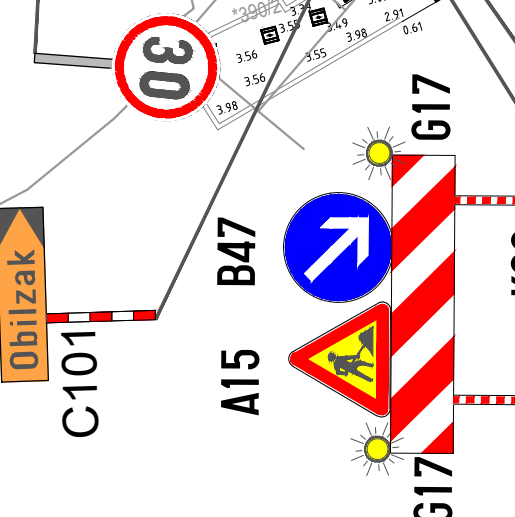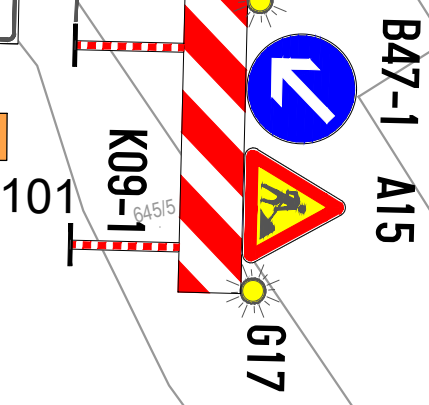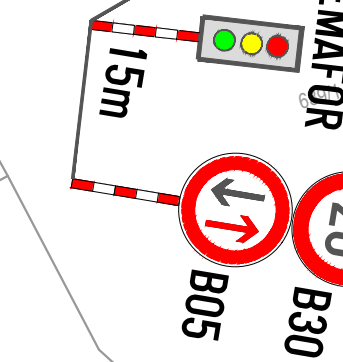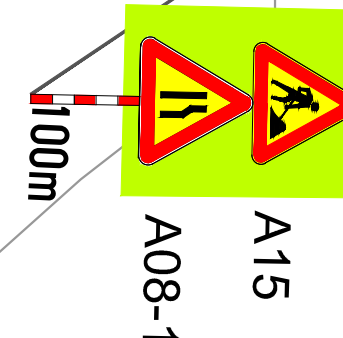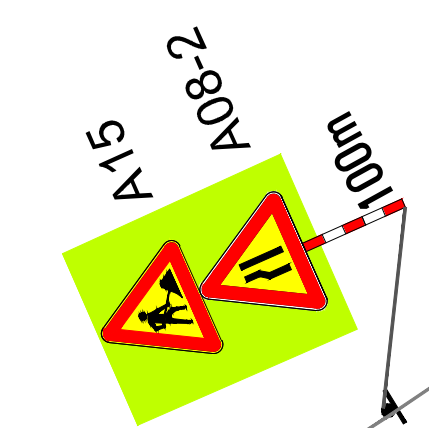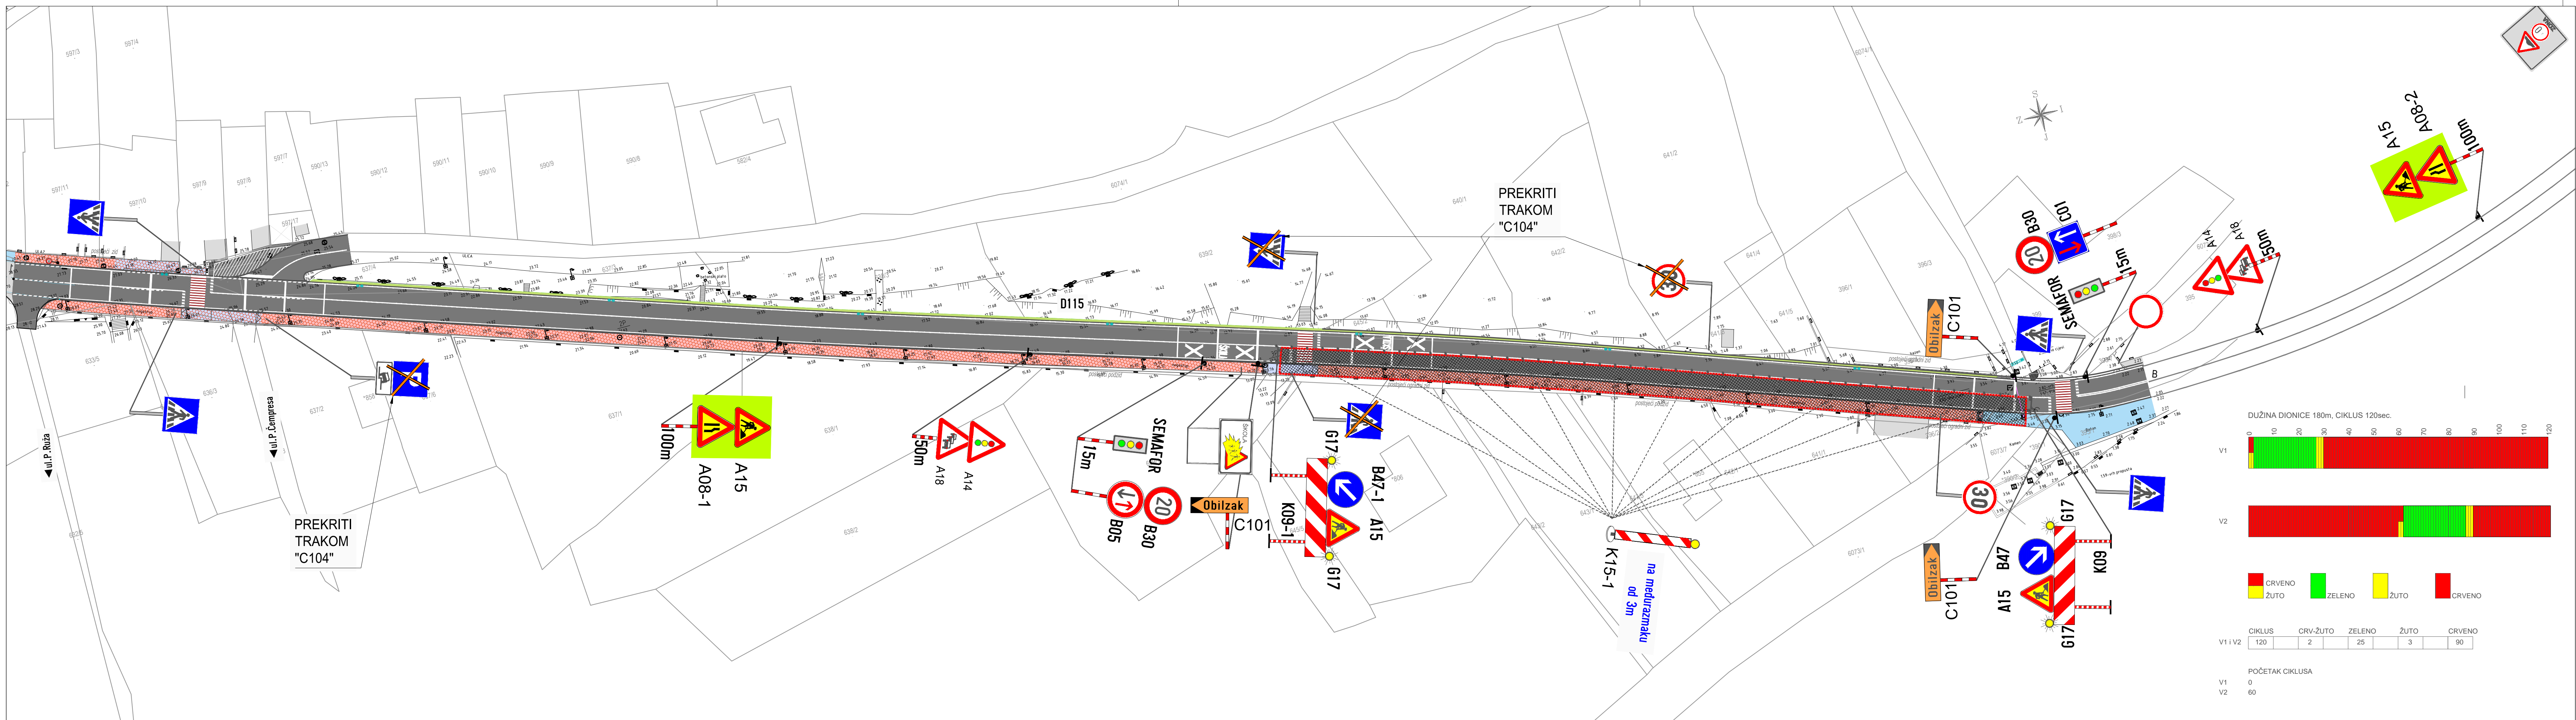

platea
KONZALTING

građevina

DRŽAVNA CESTA D115 U BOLU
OD 10+750 DO 11+150
(od kružnog toka do mora)

projektant
m.sc. RADE GUSIĆ, d.i.g.

suradnici
Danijel Bakavić, i.g.
Marija Šutalo Bakavić, i.g.

investitor
HRVATSKE CESTE d.o.o.
Voncina 3, ZAGREB

sadržaj
PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA
FAZA 4

oznaka TKP 01/24-PR prilog
datum siječanj, 2024. 3.2.-list 4
mjerilo 1 : 500
